

Panduan Penggunaan Untuk Admin Proyek

PROJECT MANAGEMENT DASHBOARD



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. SYSTEM REQUIREMENTS
- III. MEMULAI MENGGUNAKAN APLIKASI
 - 1. HALAMAN LOGIN
 - 1.1 Form Login
 - 2. AKSES CEPAT
 - 3. PROYEK
 - 3.1 Tambah Proyek
 - 3.2 Edit Proyek
 - 3.4 Hapus Proyek
 - 3.4 Unggah Dokumen Proyek
 - 3.5 Edit Status Proyek
 - 4. ITEM PROYEK
 - 4.1 Tambah Item Proyek
 - 4.2 Edit Item Proyek
 - 4.3 Hapus Item Proyek
 - 4.4 Import Data
 - 5. PERENCANAAN PROYEK
 - 5.1 Update Perencanaan Proyek
 - 6. SETTING
 - 6.1 Profil
 - 6.2 Ubah Password

I. PENDAHULUAN

Sistem Informasi PROJECT MANAGEMENT DASHBOARD adalah aplikasi *project management* berbasis web untuk tujuan memaksimalkan pengawasan & pendokumentasian *project* dan mendukung *project control* dilingkungan ITB, sehingga *project* yang berada di lingkungan ITB akan tersimpan dan terkontrol dengan baik dan dapat digunakan sebagai media pengawasan proyek baik itu proyek fisik maupun non-fisik sesuai kebutuhan laporan yang sangat berharga bagi instansi ataupun developer yang bersangkutan, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan & pengembangan yang selaras dengan kebutuhan/tuntutan/perkembangan instansi, organisasi maupun bisnis.

II. SYSTEM REQUIREMENTS

Sistem Operasi

Aplikasi PROJECT MANAGEMENT DASHBOARD dapat dijalankan pada setiap komputer dengan sistem operasi yang sudah mendukung adanya antarmuka pengguna berbasis GUI (Graphical User Interface) antara lain windows 95, xp, vista, 7 dan 8. Linux dengan antarmuka berbasis GUI serta MAC OS.

Web Browser

Sistem Informasi PROJECT MANAGEMENT DASHBOARD merupakan aplikasi berbasis web. Web browser yang digunakan adalah web browser yang sudah mendukung teknologi HTML5 antara lain Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari dan Opera. Browser Internet explorer tidak kompatibel dengan aplikasi PROJECT MANAGEMENT DASHBOARD sehingga pengguna disarankan tidak menggunakan browser Internet Explorer untuk membuka aplikasi ini.

Network

Aplikasi PROJECT MANAGEMENT DASHBOARD hanya dapat dibuka pada komputer yang terhubung ke jaringan intranet di lingkungan ITB.


III. MEMULAI MENGGUNAKAN APLIKASI

Untuk memulai aplikasi PROJECT MANAGEMENT DASHBOARD ini cukup membuka aplikasi web browser yang ada pada komputer (Google Chrome / Mozilla Firefox) lalu ketikkan url dibawah ini pada address bar :


`http://localhost/pmd`

Kemudian akan muncul halaman untuk login pengguna. Untuk login, harus memasukkan username dan password masing-masing kemudian tekan tombol login. Username dan password yang digunakan adalah username dan password yang sudah ter register.

1. Halaman Login

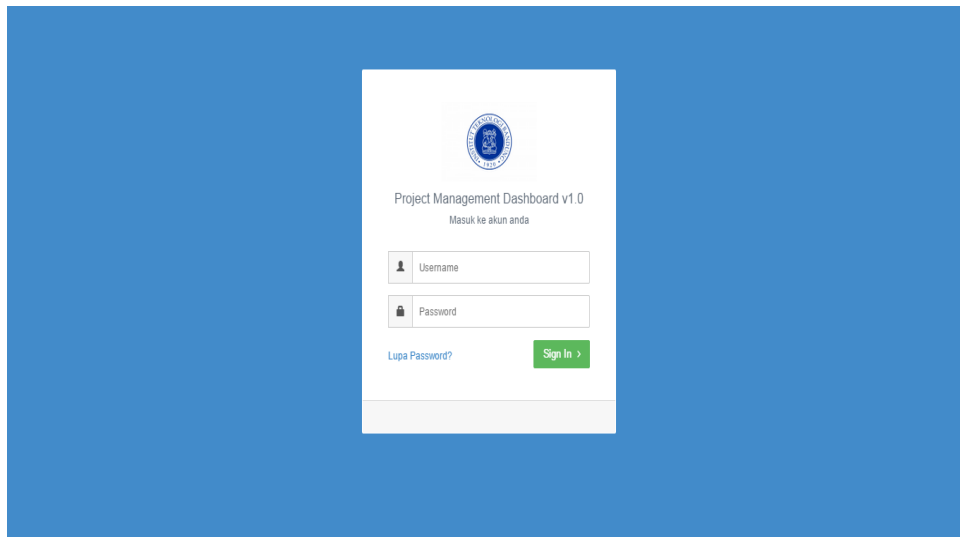

1.1. Form Login

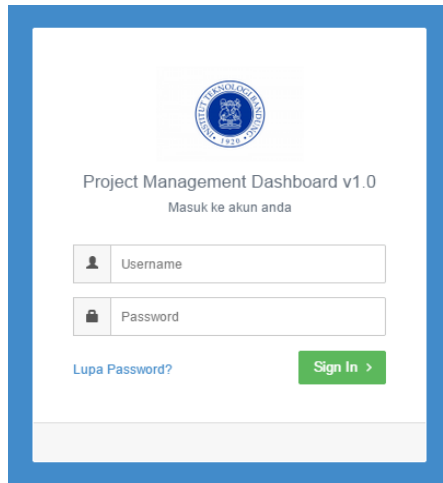


The image shows a login form for a 'Project Management Dashboard v1.0'. At the top center is a circular logo with a building and the text 'INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER' and '1926'. Below the logo, the text 'Project Management Dashboard v1.0' and 'Masuk ke akun anda' is displayed. The form contains two input fields: 'Username' with a person icon and 'Password' with a lock icon. Below the password field is a link 'Lupa Password?' and a green 'Sign In >' button.


Masukkan username dan password pada form login kemudian tekan tombol Sign In. Username dan password yang digunakan adalah username dan password yang sudah ter-register di database.

2. Akses Cepat

Anda langsung diantarkan ke halaman dashboard seperti gambar diatas. untuk melihat laporan dari proyek yang sedang berjalan, silahkan klik menu Akses Cepat yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

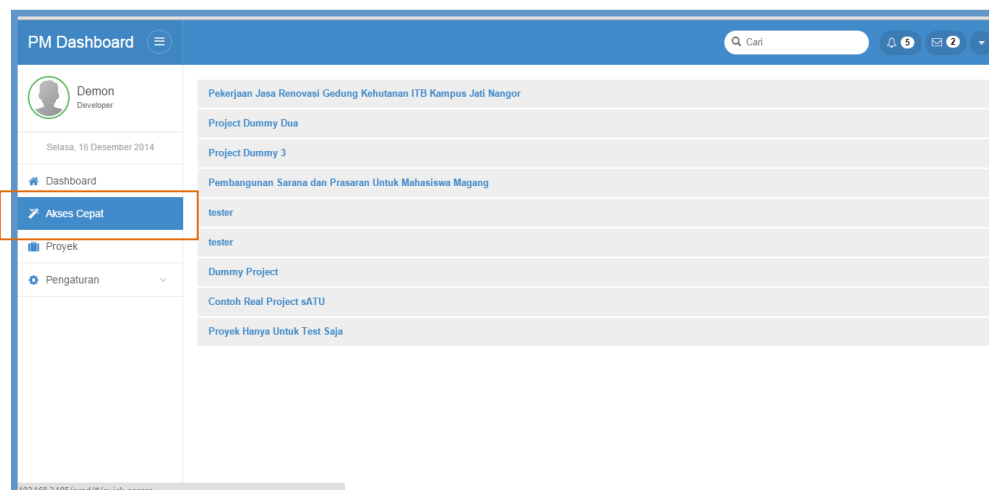

Setelah anda masuk ke halaman menu Akses Cepat, maka akan tampil tampilan list proyek yang sedang berjalan seperti gambar diatas. Untuk melihat laporan dari masing – masing proyek, silahkan klik pada salah satu proyek, maka akan tampil halaman report seperti gambar dibawah ini :

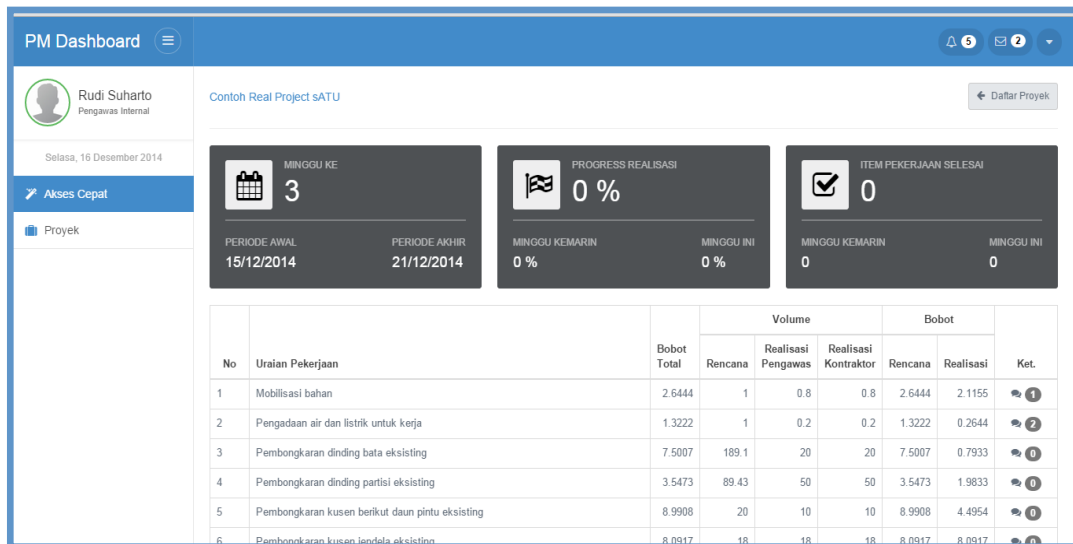

Gambar diatas menunjukan laporan berupa progress suatu proyek dari mulai waktu, realisasi, pekerjaan sampai dengan detail uraian dari proyek itu sendiri.

3. Proyek

Kemudian untuk melihat detail yang berhubungan dengan proyek, silahkan klik menu Proyek maka akan tampil tampilan seperti gambar dibawah ini :

Nama Proyek	Kontraktor	Sisa Waktu	Selesai (%)
Pembangunan Ruang Kelas SDN Cobleng 5	PT. Setia Abadi	Selesai	0 %
Konstruksi Jembatan 5 Km	PT. Setia Abadi	Selesai	0 %
Pembukaan Lahan untuk Gedung Utama	PT. Bahagia Sentosa	Selesai	0 %
Galian Gorong-Gorong sepanjang 10Km	PT. Subang Sentosa	Selesai	0 %
Pekerjaan Jasa Renovasi Gedung Kehutanan ITB Kampus Jati Nangor	CV. Aditya Mandiri	7 Minggu	0.0215 %
Project Dummy Dua	CV. Aditya Mandiri	7 Minggu	0 %
Project Dummy 3	PT. Subang Sentosa	6 Minggu	0 %
Pembangunan Sarana dan Prasarana Untuk Mahasiswa Magang	PT. Subang Sentosa	7 Minggu	0 %
tester	PT. Setia Abadi	3 Minggu	0 %
tester	PT. Setia Abadi	3 Minggu	0 %
Dummy Project	PT. Bahagia Sentosa	4 Minggu	0 %
Proyek Test Satu	PT. Setia Abadi	Dalam Mula	0 %
Contoh Real Project sATU	PT. Subang Sentosa	3 Minggu	42.1492 %
Proyek Hanya Untuk Test Saja	PT. Buana Indah Lestari	5 Minggu	1.3222 %

3.1. Tambah Proyek

Untuk menambahkan proyek baru, silahkan klik tombol tambah pada bagian kanan atas maka akan tampil halaman seperti gambar dibawah ini :

Setelah anda selesai mengisi form, silahkan klik tombol submit untuk menyimpannya dan tombol reset untuk membatalkannya

3.2. Edit Proyek

Untuk mengedit data proyek yang telah masuk, silahkan klik pada salah satu proyek yang akan dirubah seperti gambar dibawah ini :

Nama Proyek	Kontraktor	Sisa Waktu	Selesai (%)
Pembangunan Ruang Kelas SDN Coblong 5	PT. Setia Abadi	Selesai	0 %
Konstruksi Jembatan 5 Km	PT. Setia Abadi	Selesai	0 %
Pembukaan Lahan untuk Gedung Utama	PT. Bahagia Sentosa	Selesai	0 %
Galian Gorong-Gorong sepanjang 10Km	PT. Subang Sentosa	Selesai	0 %
Pekerjaan Jasa Renovasi Gedung Kehutanan ITB Kampus Jati Nangor	CV. Aditya Mandiri	7 Minggu	0.0215 %
Project Dummy Dua	CV. Aditya Mandiri	7 Minggu	0 %
Project Dummy 3	PT. Subang Sentosa	6 Minggu	0 %
Pembangunan Sarana dan Prasaran Untuk Mahasiswa Magang	PT. Subang Sentosa	7 Minggu	0 %
tester	PT. Setia Abadi	3 Minggu	0 %
tester	PT. Setia Abadi	3 Minggu	0 %
Dummy Project	PT. Bahagia Sentosa	4 Minggu	0 %
Proyek Test Satu	PT. Setia Abadi	Rikun Mulai	0 %
Contoh Real Project sATU	PT. Subang Sentosa	3 Minggu	42.1492 %
Proyek Hanya Untuk Test Saja	PT. Buana Indah Lestari	5 Minggu	1.3222 %

Setelah dipilih, anda akan dibawa ke halaman detail proyek seperti gambar dibawah ini :

PM Dashboard | Demo Developer

Selasa, 16 Desember 2014

Contoh Real Project SATU

Saat ini, Minggu ke-3
Tgl 15/12/2014 - 21/12/2014
BERLANGSUNG

Rencana (80.8279%)
Realisasi (42.1492%)
Sisa Waktu (50%)
Deviasi (-38.6787%)

Nomor Kontrak: 1200/2500/6100
Kontraktor / Pelaksana: PT. Subang Sentosa - Suhartono
Pengawas: Rudi Suharto, Putri Nurwulan, Pulisi
Waktu Pelaksanaan: 01/12/2014 - 31/12/2014
Nilai Proyek: 37.816.460

Simpan Perubahan

Aktifitas Terakhir
developer
Memperbaharui perencanaan
16/12/2014 07:58:58

Unggah Dokumen
DOKUMEN KONTRAK
contoh.xlsx

☒ A. Surat Teguran
☐ B. Surat Peringatan 1
☐ C. Surat Peringatan 2
☐ D. Surat Peringatan 3

Anda bisa langsung mengedit pada masing-masing form seperti nomor kontrak, kontraktor, pengawas, waktu, nilai proyek, dll. Setelah anda mengedit data tersebut, silahkan klik tombol

Simpan Perubahan

(simpan perubahan) untuk menyimpan data yang telah di edit tadi.

3.3. Hapus Proyek

Untuk menghapus data proyek yang telah masuk, silahkan klik pada tombol *hapus* yang ada di bagian kanan atas pada halaman detail proyek :

PM Dashboard | Admin Proyek Logistik ITS

Selasa, 16 Desember 2014

Contoh Real Project SATU

Saat ini, Minggu ke-3
Tgl 15/12/2014 - 21/12/2014
BERLANGSUNG

Rencana (80.8279%)
Realisasi (42.1492%)
Sisa Waktu (50%)
Deviasi (-38.6787%)

Nomor Kontrak: 1200/2500/6100
Kontraktor / Pelaksana: PT. Subang Sentosa - Suhartono
Pengawas: Rudi Suharto, Putri Nurwulan, Pulisi
Waktu Pelaksanaan: 01/12/2014 - 31/12/2014
Nilai Proyek: 37.816.460

Simpan Perubahan


Aktifitas Terakhir
developer
Menetapkan B. Surat Peringatan 1

Unggah Dokumen
DOKUMEN KONTRAK
contoh.xlsx

☒ A. Surat Teguran
☒ B. Surat Peringatan 1
☐ C. Surat Peringatan 2
☐ D. Surat Peringatan 3


3.4. Unggah Dokumen Proyek

Untuk mengupload dokumen yang berhubungan, silahkan klik tombol [Unggah Dokumen](#) maka akan tampil popup untuk memilih file seperti gambar dibawah ini :

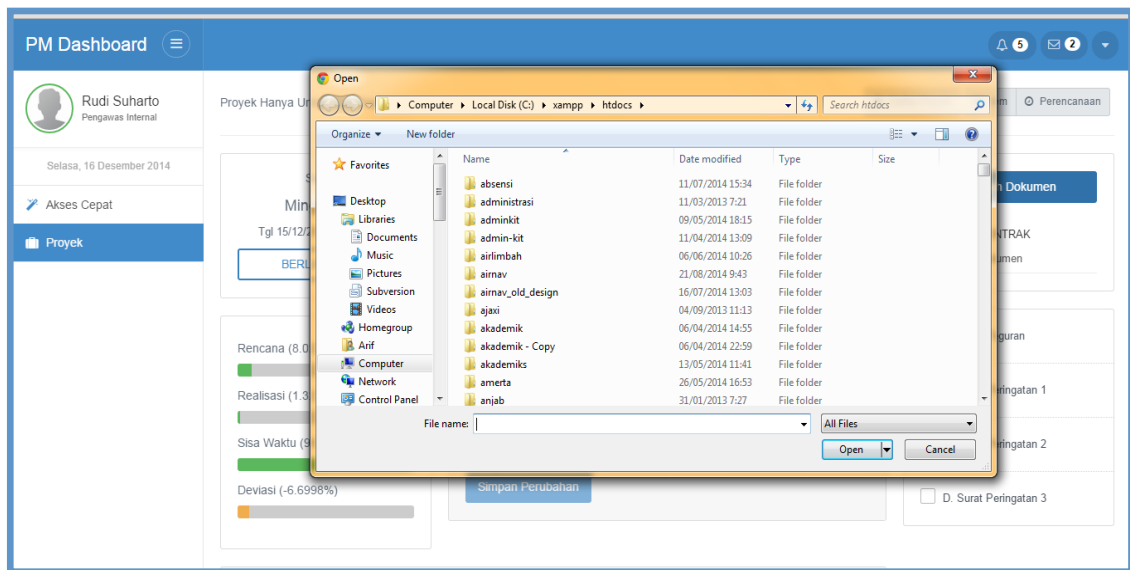


3.5. Edit Status Proyek

Untuk mengubah status proyek, silahkan pilih salah satu status yang berada pada grid kanan bawah seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini :

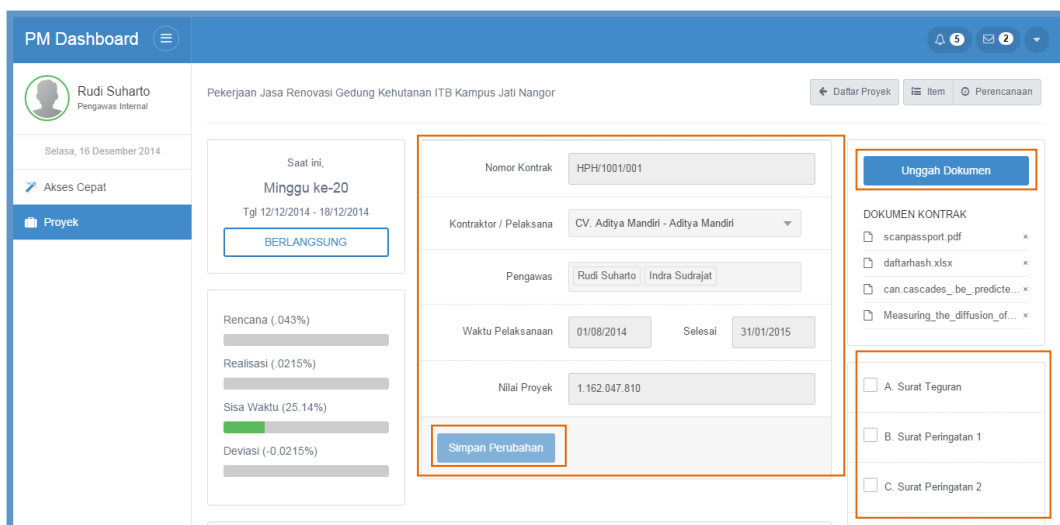


Centang salah satu status, maka akan tampil konfirmasi seperti gambar dibawah ini :




4. Item Proyek

Untuk melihat list atau detail item pekerjaan yang terkait proyek ini, silahkan klik tombol item pada button yang berada di bagian kanan atas seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini :

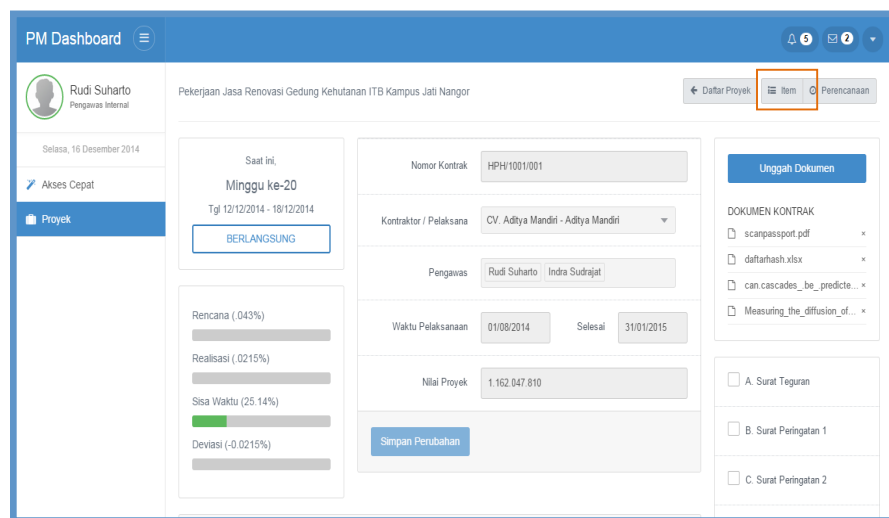

Setelah itu, maka anda akan diantarkan ke halaman detail item seperti gambar dibawah ini :

PM Dashboard



Selasa, 16 Desember 2014

Akses Cepat

Proyek

Proyek Hanya Untuk Test Saja

Detail Proyek

Perencanaan

Tambah

Ekspor

Search:

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Bobot (%)	Jumlah (Rp)	
1.	LANTAI 1							
1.1.	A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.1.1.	Mobilisasi bahan	Pengangkutan bahan material ke lokasi	ls	1	1.000.000	2.644	1.000.000	
1.1.2.	Pengadaan air dan listrik untuk kerja	Pengadaan air dan listrik untuk kerja selama waktu pelaksanaan	ls	1	500.000	1.322	500.000	
1.2.	B. PEKERJAAN INTERIOR							
1.2.1.	Pembongkaran dinding bata eksisting	Dinding bata eksisting dibongkar dan dibuang keluar lokasi	m2	189.1	15.000	7.501	2.836.500	
1.2.2.	Pembongkaran dinding partisi eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	m2	89.43	15.000	3.547	1.341.450	
1.2.3.	Pembongkaran kusen berikut daun pintu eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	20	170.000	8.991	3.400.000	
1.2.4.	Pembongkaran kusen jendela eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	18	170.000	8.092	3.060.000	

4.1. Tambah Item Proyek

Untuk menambahkan item baru, silahkan klik tombol

Tambah

 (tambah) pada bagian kanan atas, maka akan tampil tampilan popup seperti gambar dibawah ini :

Buat Item Baru

(*) Menandakan wajib diisi.

Parent Item

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

Nama Item*

Kolom Nama Item wajib diisi

Spesifikasi*

Volume*

0

Satuan*

Harga Satuan*

0

Submit

Reset

Setelah anda selesai mengisi form, silahkan klik tombol submit untuk menyimpannya dan tombol reset untuk membatalkannya

Submit

Reset

4.2. Edit Item Proyek

Untuk meng-edit data item yang telah masuk, silahkan klik icon pencil / edit yang berada pada kolom paling kanan pada masing-masing list item yang ditunjukkan seperti gambar dibawah ini :

PM Dashboard

Rudi Suharto
Pengawas Internal

Selasa, 16 Desember 2014

Akses Cepat

Proyek

Proyek Hanya Untuk Test Saja

Detail Proyek Perencanaan + Tambah Ekspor

Search:

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Bobot (%)	Jumlah (Rp)	
1.	LANTAI 1							
1.1.	A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.1.1.	Mobilisasi bahan	Pengangkutan bahan material ke lokasi	ls	1	1.000.000	2,644	1.000.000	
1.1.2.	Pengadaan air dan listrik untuk kerja	Pengadaan air dan listrik untuk kerja selama waktu pelaksanaan	ls	1	500.000	1,322	500.000	
1.2.	B. PEKERJAAN INTERIOR							
1.2.1.	Pembongkaran dinding bata eksisting	Dinding bata eksisting dibongkar dan dibuang keluar lokasi	m2	189.1	15.000	7,501	2.836.500	
1.2.2.	Pembongkaran dinding partisi eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	m2	89.43	15.000	3,547	1.341.450	
1.2.3.	Pembongkaran kusen berlitur daun pintu eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	20	170.000	8,991	3.400.000	
1.2.4.	Pembongkaran kusen jendela eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	18	170.000	8,092	3.060.000	

Setelah itu maka akan tampil tampilan seperti gambar dibawah ini :

Buat Item Baru

(*) Menandakan wajib diisi.

Parent Item: A. PEKERJAAN PERSIAPAN

Nama Item*: Mobilisasi bahan

Spesifikasi*: Pengangkutan bahan material ke lokasi

Volume*: 1

Satuan*: ls


Harga Satuan*: 1000000

Submit Reset

Setelah anda selesai meng-edit data, silahkan klik tombol submit untuk menyimpannya dan tombol reset untuk membatalkannya

4.3. Hapus item Proyek

Untuk menghapus data item yang telah masuk, silahkan klik pada icon *hapus* yang berada pada kolom paling kanan pada masing–masing list item yang ditunjukkan seperti gambar dibawah ini :

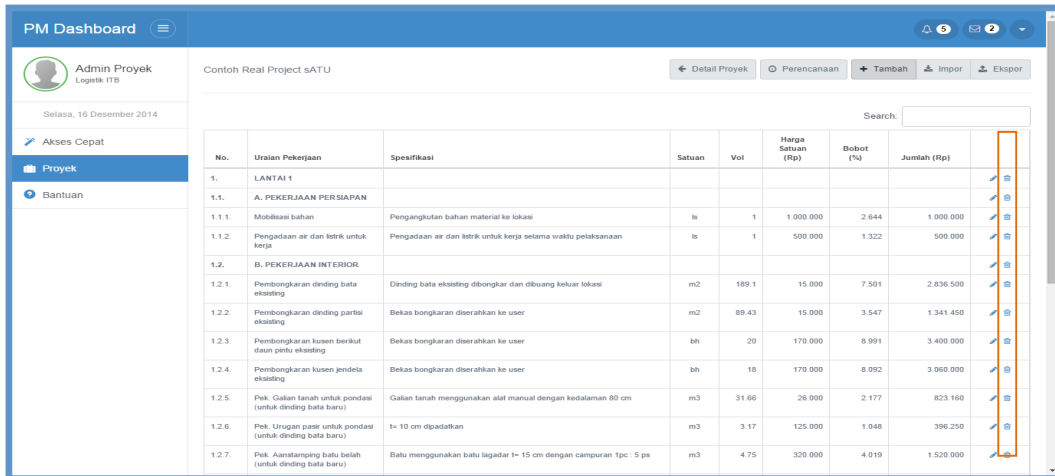

PM Dashboard

Admin Proyek
Logistik ITB

Selasa, 16 Desember 2014

Akses Cepat

Proyek

Bantuan


Contoh Real Project sATU

Detail Proyek Perencanaan Tambah Import Ekspor

Search:

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Bobot (%)	Jumlah (Rp)	
1.	LANTAI 1							
1.1.	A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.1.1.	Mobilisasi bahan	Pengangkutan bahan material ke lokasi	ls	1	1.000.000	2.644	1.000.000	
1.1.2.	Pengadaan air dan listrik untuk kerja	Pengadaan air dan listrik untuk kerja selama waktu pelaksanaan	ls	1	500.000	1.322	500.000	
1.2.	B. PEKERJAAN INTERIOR							
1.2.1.	Pembongkaran dinding bata eksisting	Dinding bata eksisting dibongkar dan dibuang keluar lokasi	m2	189.1	15.000	7.501	2.836.500	
1.2.2.	Pembongkaran dinding partisi eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	m2	89.43	15.000	3.547	1.341.450	
1.2.3.	Pembongkaran kusen berkit daun pintu eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	20	170.000	8.991	3.400.000	
1.2.4.	Pembongkaran kusen jendela eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	18	170.000	8.092	3.060.000	
1.2.5.	Pek. Galian tanah untuk pondasi (untuk dinding bata baru)	Galian tanah menggunakan alat manual dengan kedalaman 80 cm	m3	31.66	26.000	2.177	823.160	
1.2.6.	Pek. Urugan pasir untuk pondasi (untuk dinding bata baru)	Urugan pasir untuk pondasi t= 10 cm dipadatkan	m3	3.17	125.000	1.048	396.250	
1.2.7.	Pek. Anai tamping batu belah (untuk dinding bata baru)	Batu menggunakan batu lagadar t= 15 cm dengan campuran tpc : 5 pa	m3	4.75	320.000	4.019	1.520.000	

Setelah itu, akan muncul konfirmasi seperti gambar dibawah ini :

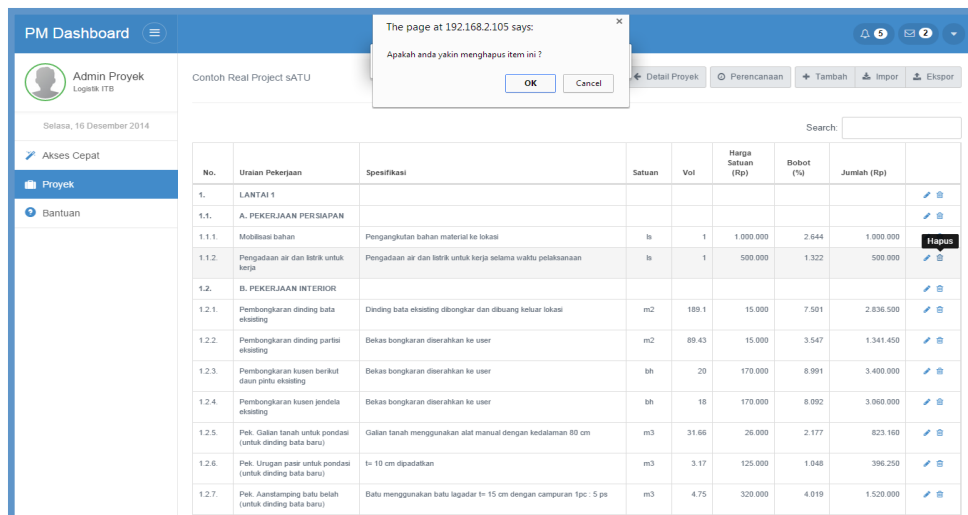

PM Dashboard

Admin Proyek
Logistik ITB

Selasa, 16 Desember 2014

Akses Cepat

Proyek

Bantuan

Contoh Real Project sATU

Detail Proyek Perencanaan Tambah Import Ekspor

Search:


The page at 192.168.2.105 says:
Apakah anda yakin menghapus item ini ?
OK Cancel

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Bobot (%)	Jumlah (Rp)	
1.	LANTAI 1							
1.1.	A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.1.1.	Mobilisasi bahan	Pengangkutan bahan material ke lokasi	ls	1	1.000.000	2.644	1.000.000	
1.1.2.	Pengadaan air dan listrik untuk kerja	Pengadaan air dan listrik untuk kerja selama waktu pelaksanaan	ls	1	500.000	1.322	500.000	
1.2.	B. PEKERJAAN INTERIOR							
1.2.1.	Pembongkaran dinding bata eksisting	Dinding bata eksisting dibongkar dan dibuang keluar lokasi	m2	189.1	15.000	7.501	2.836.500	
1.2.2.	Pembongkaran dinding partisi eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	m2	89.43	15.000	3.547	1.341.450	
1.2.3.	Pembongkaran kusen berkit daun pintu eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	20	170.000	8.991	3.400.000	
1.2.4.	Pembongkaran kusen jendela eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	18	170.000	8.092	3.060.000	
1.2.5.	Pek. Galian tanah untuk pondasi (untuk dinding bata baru)	Galian tanah menggunakan alat manual dengan kedalaman 80 cm	m3	31.66	26.000	2.177	823.160	
1.2.6.	Pek. Urugan pasir untuk pondasi (untuk dinding bata baru)	Urugan pasir untuk pondasi t= 10 cm dipadatkan	m3	3.17	125.000	1.048	396.250	
1.2.7.	Pek. Anai tamping batu belah (untuk dinding bata baru)	Batu menggunakan batu lagadar t= 15 cm dengan campuran tpc : 5 pa	m3	4.75	320.000	4.019	1.520.000	

Klik tombol ok untuk menghapus data dan klik tombol cancel untuk batal.

4.4. Import Data

Untuk menginput data item tidak hanya bisa dilakukan dengan cara manual, akan tetapi anda juga bisa melakukannya dengan cara mengimport data, caranya silahkan klik tombol import yang berada pada bagian kanan atas seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini :

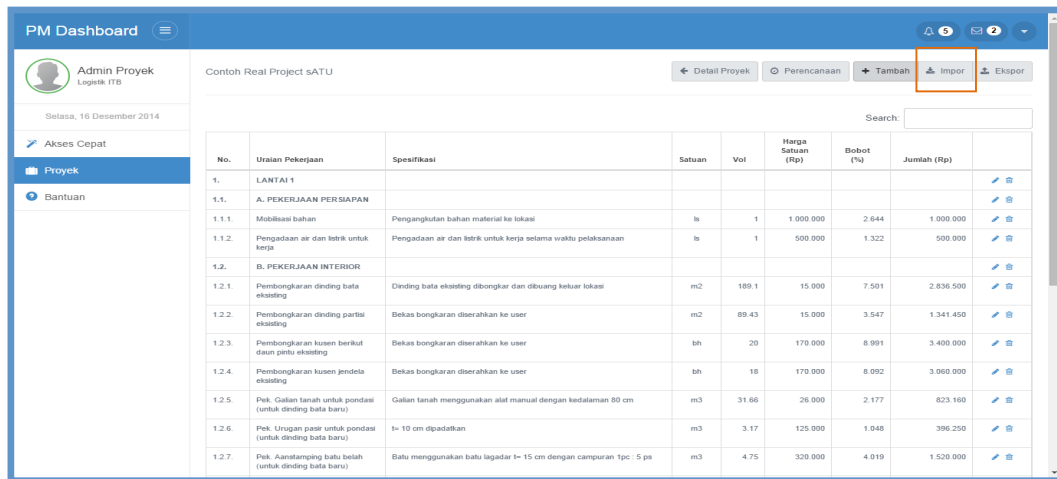

PM Dashboard

Admin Proyek
Logistik ITB

Selasa, 16 Desember 2014

Akses Cepat

- Proyek
- Bantuan


Contoh Real Project sATU

Detail Proyek | Perencanaan | **Tambah** | **Import** | Ekspor

Search:

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Bobot (%)	Jumlah (Rp)
1.	LANTAI 1						
1.1.	A. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.1.1.	Mobilisasi bahan	Pengangkutan bahan material ke lokasi	ls	1	1.000.000	2.644	1.000.000
1.1.2.	Pengadaan air dan listrik untuk kerja	Pengadaan air dan listrik untuk kerja selama waktu pelaksanaan	ls	1	500.000	1.322	500.000
1.2.	B. PEKERJAAN INTERIOR						
1.2.1.	Pembongkaran dinding bata eksisting	Dinding bata eksisting dibongkar dan dibuang keluar lokasi	m2	189.1	15.000	7.501	2.836.500
1.2.2.	Pembongkaran dinding partisi eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	m2	89.43	15.000	3.547	1.341.450
1.2.3.	Pembongkaran kusen berikut daun partu eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	20	170.000	8.991	3.400.000
1.2.4.	Pembongkaran kusen jendela eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	16	170.000	6.092	3.060.000
1.2.5.	Pek. Galian tanah untuk pondasi (untuk dinding bata baru)	Galian tanah menggunakan alat manual dengan kedalaman 80 cm	m3	31.66	26.000	2.177	823.160
1.2.6.	Pek. Urugan pasir untuk pondasi (untuk dinding bata baru)	1+ 10 cm dipadatkan	m3	3.17	125.000	1.048	396.250
1.2.7.	Pek. Asamlamping batu belah (untuk dinding bata baru)	Batu menggunakan batu tegar 1+ 15 cm dengan campuran tpi: 5 ps	m3	4.75	320.000	4.019	1.520.000

Setelah itu, akan muncul popup untuk memilih file yang akan di import datanya :

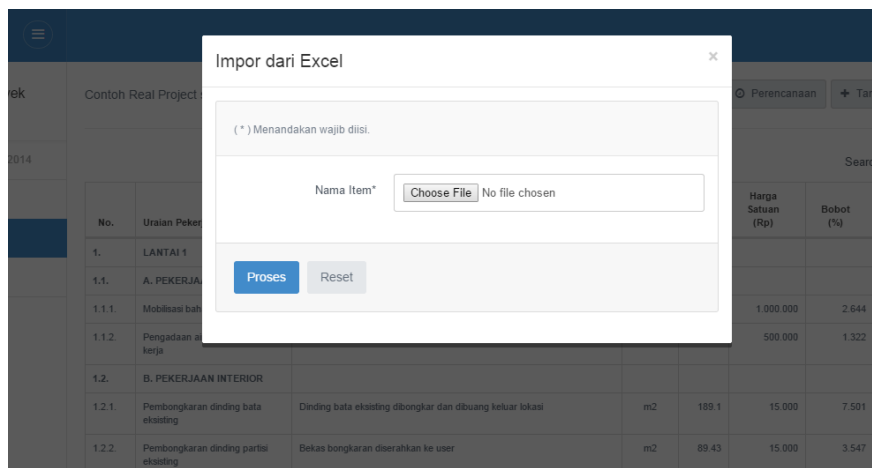

Import dari Excel

(*) Menandakan wajib diisi.

Nama Item* No file chosen

Setelah file dipilih, Klik tombol prose untuk mengimport data dan klik tombol reset untuk batal.

5. Perencanaan Proyek

Untuk masuk ke halaman perencanaan dari proyek, silahkan klik tombol perencanaan pada bagian kanan atas seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

PM Dashboard

Rudi Suharto

Pengawas Internal

Selasa, 16 Desember 2014

Akses Cepat

Proyek

Proyek Hanya Untuk Test Saja

Detail Proyek

Perencanaan

Tambah

Ekspor

Search:

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Bobot (%)	Jumlah (Rp)	
1.	LANTAI 1							
1.1.	A. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.1.1.	Mobilisasi bahan	Pengangkutan bahan material ke lokasi	ls	1	1.000.000	2.644	1.000.000	
1.1.2.	Pengadaan air dan listrik untuk kerja	Pengadaan air dan listrik untuk kerja selama waktu pelaksanaan	ls	1	500.000	1.322	500.000	
1.2.	B. PEKERJAAN INTERIOR							
1.2.1.	Pembongkaran dinding bata eksisting	Dinding bata eksisting dibongkar dan dibuang keluar lokasi	m2	189.1	15.000	7.501	2.836.500	
1.2.2.	Pembongkaran dinding partisi eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	m2	89.43	15.000	3.547	1.341.450	
1.2.3.	Pembongkaran kusen berikut daun pintu eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	20	170.000	8.991	3.400.000	
1.2.4.	Pembongkaran kusen jendela eksisting	Bekas bongkaran diserahkan ke user	bh	18	170.000	8.092	3.060.000	

Setelah itu maka akan tampil halaman perencanaan seperti gambar dibawah ini :

PM Dashboard

Rudi Suharto

Pengawas Internal

Selasa, 16 Desember 2014

Akses Cepat

Proyek

Proyek Hanya Untuk Test Saja

Detail Proyek

Item Pekerjaan

Simpan

Search:

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot	Minggu				
			1	2	3	4	5
1.	LANTAI 1						
1.1.	A. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.1.1.	Mobilisasi bahan	2.6444		1	1	0.6444	
1.1.2.	Pengadaan air dan listrik untuk kerja	1.3222	1.322	0.0002			
1.2.	B. PEKERJAAN INTERIOR						
1.2.1.	Pembongkaran dinding bata eksisting	7.5007	1	3	3	0.5007	
1.2.2.	Pembongkaran dinding partisi eksisting	3.5473		1.5	2	0.0473	
1.2.3.	Pembongkaran kusen berikut daun pintu eksisting	8.9908	2		3	2	1.990
1.2.4.	Pembongkaran kusen jendela eksisting	8.0917		2	3	3	0.091
1.2.5.	Pek. Galian tanah untuk pondasi (untuk dinding bata baru)	2.1767		1	1	0.1767	

5.1. Update Perencanaan Proyek

Silahkan isi persentase pekerjaan yang telah dikerjakan pada masing-masing item pada kolom setiap minggunya seperti gambar dibawah ini :

PM Dashboard

Rudi Suharto
Pengawas Internal

Selasa, 16 Desember 2014

Akses Cepat

Proyek

Proyek Hanya Untuk Test Saja

Detail Proyek Item Pekerjaan **Simpan**

Search:

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot	Minggu				
			1	2	3	4	5
1.	LANTAI 1						
1.1.	A. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.1.1.	Mobilisasi bahan	2.6444		1	1	0.6444	
1.1.2.	Pengadaan air dan listrik untuk kerja	1.3222	1.322	0.0002			
1.2.	B. PEKERJAAN INTERIOR						
1.2.1.	Pembongkaran dinding bata eksisting	7.5007	1	3	3	0.5007	
1.2.2.	Pembongkaran dinding partisi eksisting	3.5473		1.5	2	0.0473	
1.2.3.	Pembongkaran kusen berikut daun pintu eksisting	8.9908	2		3	2	1.990
1.2.4.	Pembongkaran kusen jendela eksisting	8.0917		2	3	3	0.091
1.2.5.	Pek. Galian tanah untuk pondasi (untuk dinding bata baru)	2.1767		1	1	0.1767	

Setelah anda selesai mengisi kolom persentase pekerjaan per- minggunya, klik tombol simpan pada bagian kanan atas untuk menyimpan data seperti yang ditunjukkan

6. Setting

Anda bisa merubah profil atau password anda, untuk melakukan itu silahkan klik tombol panah kebawah di bagian kanan atas dari top bar seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini :

PM Dashboard

Rudi Suharto
Pengawas Internal

Jumat, 19 Desember 2014

Akses Cepat

Proyek

Bantuan

Show 10 entries

Search:

Nama Proyek	Kontraktor		
PENGADAAN PEKERJAAN JASA INTERIOR MELEKAT DAN FURNITURE TOWER III DAN IV	PT. Buana Indah Lestari		
tester	PT. Setia Abadi	2 Minggu	0 %
tester	PT. Setia Abadi	2 Minggu	0 %
Contoh Real Project sATU	PT. Subang Sentosa	2 Minggu	42.1492 %
Dummy Project	PT. Bahagia Sentosa	4 Minggu	0 %
Proyek Hanya Untuk Test Saja	PT. Buana Indah Lestari	4 Minggu	1.3222 %
Pekerjaan Jasa Renovasi Gedung Kehutanan ITB Kampus Jati Nangor	CV. Aditya Mandiri	7 Minggu	0.0215 %
Pembangunan Ruang Kelas SDN Coblong 5	PT. Setia Abadi	Selasa	0 %
Konstruksi Jembatan 5 Km	PT. Setia Abadi	Selasa	0 %
Pembukaan Lahan untuk Gedung Utama	PT. Bahagia Sentosa	Selasa	0 %


Showing 1 to 10 of 10 entries



Previous 1 Next

Profil
Ubah Password
Bantuan
Sign Out

6.1. Profil


Untuk merubah profil anda, silahkan klik setting. Maka akan muncul form berupa popup. Seperti gambar dibawah ini :

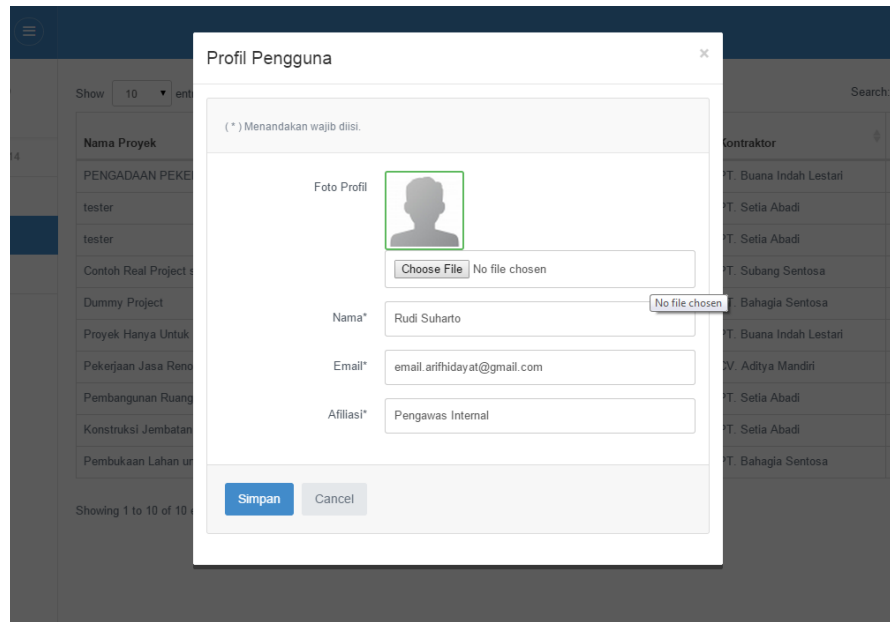



Setelah form diisi silahkan klik tombol  (simpan) untuk menyimpan data profil anda, dan klik tombol  (cancel) untuk membatalkannya.

6.2. Ubah Password

Untuk merubah password anda, silahkan klik ubah password. Maka akan muncul form berupa popup. Seperti gambar dibawah ini :



Setelah form password diisi silahkan klik tombol  (simpan) untuk menyimpan password

baru anda anda, dan klik tombol  (cancel) untuk membatalkannya.
